

EMVI, tenzij

Voorstellen

- Even voorstellen:



Peter Krombos, contractmanager bij de provincie Overijssel

EMVI, tenzij

Presentatie

- EMVI, tenzij: Wat is een goede motivering
- Wat zijn geïntegreerde contracten
- Integraal groot onderhoud
- Reconstructie kruispunt, aanleg tunnel en ecoduct
- Vragen

EMVI, tenzij

EMVI

EMVI, tenzij: Wat is een goede motivering?

- sturen op beleidscriteria en standaarden
 - projectbeheersing
 - duurzaamheid
 - omgevingsmanagement
 - doorstroming van verkeer / opties
- Projects specifieke kwaliteits-, prestatie- en prijscriteria
- Beperk je in de hoofd-, en subcriteria

EMVI, tenzij

Geïntegreerd contracteren

- Wat zijn geïntegreerde contracten

Contracten onder de RAW 2010 en de UAV-GC 2005 waarbij we van de gebaande paden afwijken bij realiseren van projectdoelstellingen en het inschakelen van de markt. Daarbij bespelen we het volledige speelveld van initiatief tot en met beheer en onderhoud.

Stelling: benut de ruimte.

EMVI, tenzij

Integraal goot onderhoud

Scope project

- onderhoud aan de rijbaan (17,2 km)
- onderhoud aan kunstwerken (4 stuks)
- onderhoud aan vangrail
- aanbrengen faunavoorzieningen
- aanbrengen bermverharding

EMVI, tenzij

Bonus/Malus regeling



1. Oplevering conform aantal dagen volgens ingediende tijdschema opdrachtnemer
2. Korting van € 30.000 per dag op overschrijding van het ingediende tijdschema
3. Binnen het ingediende tijdschema afgerond, bonus van € 20.000 per dag

EMVI, tenzij

Gunning op EMVI



- De aanbiedingsprijs
- Tijdsduur (in 35 kalenderdagen)

Fictieve inschrijfsom=aanbiedingsprijs – fictieve bonus (€ 50.000/dag)

EMVI, tenzij


Aanbestedingsresultaat

In-schrijver	Inschrijfsom	Fictieve inschrijfsom	Aantal werkdagen nodig voor uitvoering
1	€ 3.040.000	€ 1.740.000	9
2	€ 2.306.000	€ 1.856.000	26
3	€ 2.892.000	€ 2.042.000	18
4	€ 2.644.000	€ 2.194.000	26
5	€ 2.794.000	€ 2.644.000	32
6	€ 2.898.000	€ 2.698.000	31
7	€ 2.790.000	€ 2.790.000	35

EMVI, tenzij

Reconstructie kruispunt, aanleg tunnel en ecodeuct

EMVI criteria

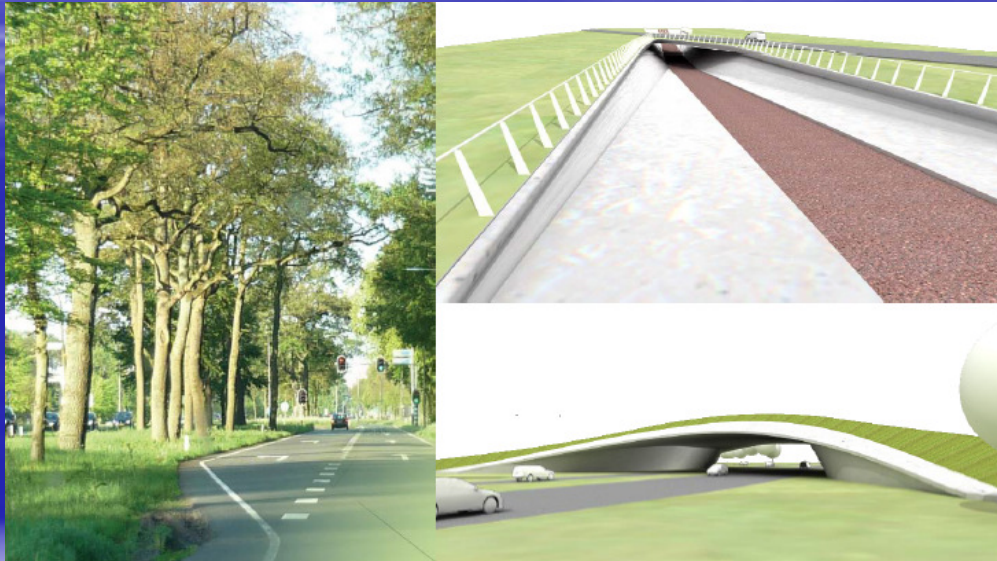

- A. Plan van aanpak
- B. Risicobeheersing
- C. Planning
- D. Versnelling planning
- E. Omgevingsmanagement
- F. Weekend afsluitingen
- G. Engineering, ontwerp en uitvoering
- H. Presentatie door projectteam

EMVI, tenzij

Aanbestedingsresultaat



NR.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	Ja/nee	EMVI	Evaluatie prijs	Inschrijf-bedrag
1	8.5	8.4	8.6	2.0	8.4	3.0	8.5	8.9	ja		1	
2	8.1	7.1	8.6	3.0	8.7	3.0	9.0	8.6	ja		2	
3	6.8	6.3	7.1	4.0	6.9	3.0	6.7	6.4	ja		3	
4	7.3	7.5	8.3	0.0	6.8	0.0	8.2	7.3	ja		4	
5	5.6	5.4	6.0	2.0	5.8	0.0	5.7	6.0	nee		5	
Max. meerwaarde in €									totaal			
	0	300.000	300.000	200.000	300.000	200.000	700.000	0		2.000.000		
1	0	180.000	195.000	66.667	180.000	125.000	437.500	0	2	1.184.167	8.984.833	10.169.000
2	0	82.500	195.000	100.000	202.500	125.000	525.000	0	1	1.230.000	7.052.000	8.282.000
3	0	22.500	82.500	133.333	67.500	125.000	122.500	0	4	553.333	9.796.667	10.350.000
4	0	112.500	172.500	0	60.000	200.000	385.000	0	3	930.000	9.557.000	10.487.000
5	0	0	0	0	0	0	0	0				

Emvi, tenzij

Vragen ?

Vragen ?

ERROR: undefined
OFFENDING COMMAND:

STACK:
